PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-[5]

Fase [3] · [Analisis Kebutuhan]

Kelompok · Kelas

Kelompok [5] · [4KA21]

Proyek · Klien

[Pembuatan Website Katalog rentlaptop.id] · [Sandi Wahyudi]

Pelapor · Tanggal

[Bidadari Surga F [PM] · [26-10-2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai Jadwal

PROGRES RENCANA

39%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

39%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: Desain Sistem dan Antar Muka· Minggu 5 · aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
3	Tanda tangan SRS klien	Bidadari Surga Firdausi	31-10 [M5]	✓ Selesai	dokumen notulen
3	Finalisasi revisi SRS	Salwa Sara	28-10 [M5]	✓ Selesai	dokumen
3	Membuat ERD	Salwa Sara	31-10 [M5]	✓ Selesai	Terpisah dari SRS
3	Pembuatan Rancangan antarmuka sisi pelanggan	Siti nazua	31-10 [M5]	Belum	Salah Perhitungan dan Klien telat memberi Data Penjualan

Selesai 3 dari 4 tugas


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Menerangkan terkait SRS berdasarkan wawancara minggu sebelumnya
- Tanda tangan Persetujuan Klien terkait SRS
- Hasil Revisi pada github
- Notulen dan dokumentasi meeting pada Gdrive

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.

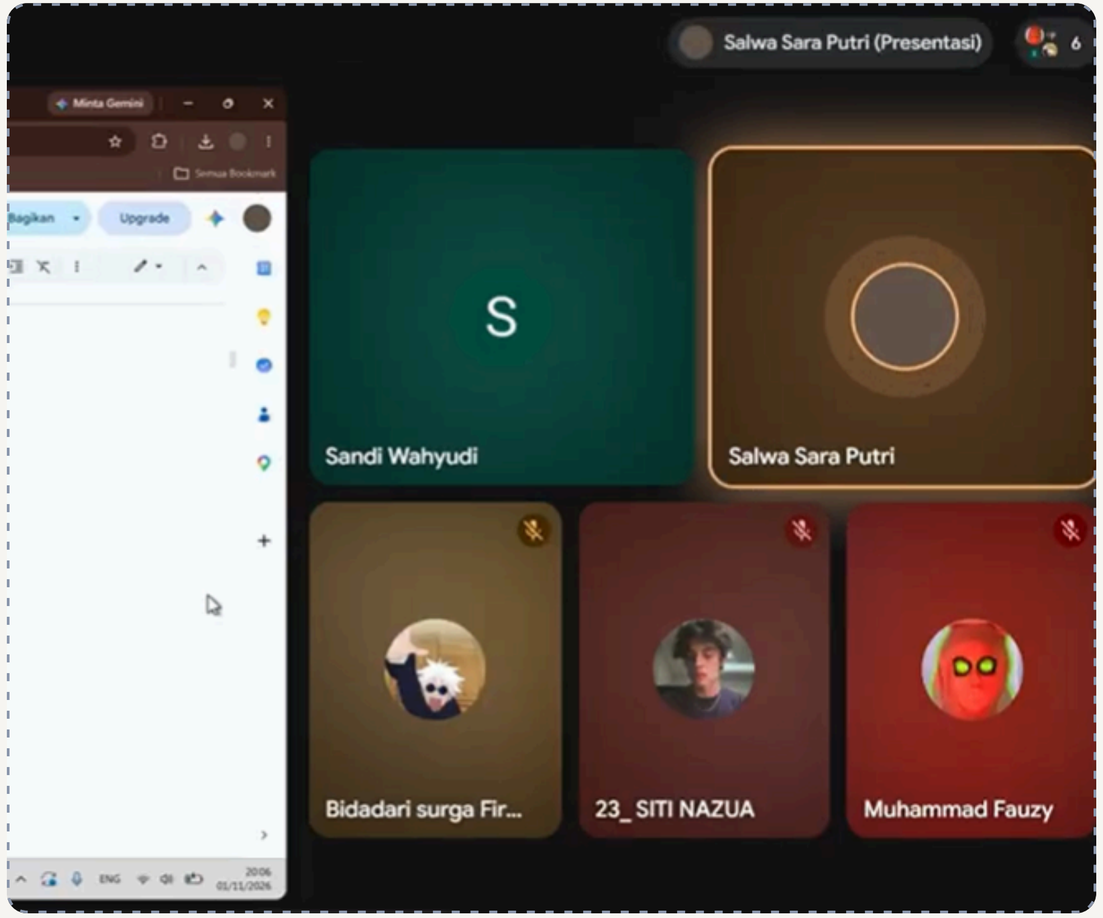

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Bidadari Surga Fiirdausi	Project Manager	memimpin rapat klien lanjutan dan observasi bersama klien,	8
Salwa Sara	System Analyst	rapat klien lanjutan dan observasi bersama klien, penyusunan	8
Siti Nazua	System Designer	rapat klien lanjutan menentukan detail rancangan Website	8
Muhammad Ilyas	Programmer	mereview kebutuhan teknis website	8
Muhammad Fauzy	Technical Writer	Notulensi wawancara dan dokumentasi	8

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

31/10 · daring

Hadir: Sandi Wahyudi, Bidadari Surga Firdausi, Salwa Sara, Siti Nazua, Muhammad Fauzy

Yang dibahas

menerangkan hasil SRS, cara Kerja Web dan melakukan perevisian di tempat (tidak ada). Klien menyetujui SRS dan menandatangani

Masukan dan keputusan klien

Tidak ada, Pada saat ini klien sudah setuju dengan alur kerja web serta detail web berdasarkan hasil dari meeting minggu sebelumnya yg ada pada SRS

Perubahan kebutuhan

Tidak ada

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-02	Kelengkapan data penjualan klien	[Sedang]	Memastikan Data yang diberika Klien lengkap	PM
R-03	Konfirmasi Persetujuan Klien terhadap Desain Antar Muka	[Sedang]	Menberikan serta menjelaskan desain berdasarkan data yang telah didapat	SD

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

Revisi dokumen

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4	Peninjauan ulang ERD dan Revisi	Salwa Sara	4-11
4	Pembuatan Rancangan Desain antarmuka sisi pelanggan	Siti Nazua	7-11

JATUH TEMPO

Salwa sara, Siti Nazua

Minggu 6 · [dd-mm-yyyy]

Pertemuan Klien kemungkinan dilakukan di akhir Pekan
